

Organisation logistique

Organisation logistique des flux matières

Nous avons lors de notre étude de faisabilité identifié et localisé les ressources mobilier existantes au sein du réseau Damart et mobilisable pour notre projet.

Magasins « ressources »


↳ magasins au concept bien-être 2 qui sont à rénover au tout dernier concept en 2019 et après

Ce travail nous a permis d'identifier les magasins qui devaient faire l'objet d'un procédé spécifique de démontage, emballage et stockage en vue d'une réutilisation future.

Notre projet a été réalisé à partir des mobiliers de seconde vie issus des magasins de Paris Châtelet et Saint Germain.

Les mobiliers et éléments ont été livrés chez Atelier 41 pour stockage dans l'attente de leur affectation.

Nous avons décidé à l'issue de l'étude de faisabilité de faire du magasin d'Aix en Provence notre 1er prototype « refresh ».

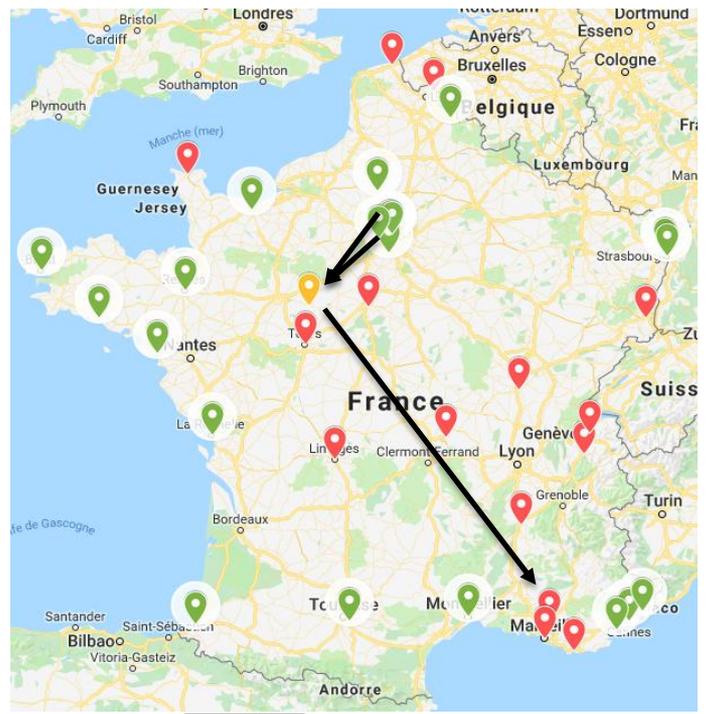

 **partenaire**

 Magasins ressources

 Magasins refresh

 Atelier 41

Projet Refresh - 3. Mise en œuvre opérationnelle & essaimage

Ce document est la propriété de Damart. Il ne peut être utilisé, reproduit ou diffusé sans son accord préalable et explicite.



Mise en place d'un process spécifique de démontage, emballage et stockage des mobiliers et éléments de mobilier « ressources »

A T E L I E R 4 1

Process Refresh - **DAMART**



Consignes générales

- Repérage des zones à démonter
- Prise de photos avant démontage
- Vérification de l'état général de l'ensemble
- Identification des parties abimées le cas échéant

Panneaux muraux

Dépose des tablettes et de l'accastillage

- Contrôle de l'état, mise au rebut les éléments défectueux
- Nettoyage des éléments
- Conditionnement : protection, emballage, identification


Dépose des panneaux muraux

- Démontage des panneaux du mur par dévêtissement
- Nettoyage des panneaux
- Conditionnement : protection entre panneaux faces crémaillères (mousse), emballage, identification
- Dévisage des accroches métalliques du mur

Cabines d'essayages

Dépose des éléments des cabines

- Démontage des miroirs de la cloison par dévêtissement
- Dévisage des patères et de la barre de charge de la cabine PMR de la cloison
- Dépose des rideaux des cabines, tringles et embases
- Contrôle de l'état, mise au rebut les éléments défectueux
- Nettoyage des éléments
- Conditionnement : protection, emballage, identification

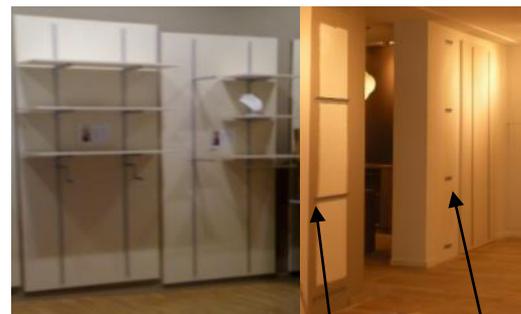

Panneaux muraux avec tablettes et accastillage

Accroches métalliques au mur



Projet Refresh - 3. Mise en œuvre opérationnelle & essaimage

Ce document est la propriété de Damart. Il ne peut être utilisé, reproduit ou diffusé sans son accord préalable et explicite.

DAMART

Mise en place d'un process spécifique de démontage, emballage et stockage des mobiliers et éléments de mobilier « ressources »


A T E L I E R 4 1

Process Refresh - **DAMART**

Cadres

Dépose des cadres et cadres vitrine

- Démontage des cadres par dévêissement
- Contrôle de l'état, mise au rebut les éléments défectueux
- Dévisage des accroches métalliques du mur
- Nettoyage des éléments
- Conditionnement : protection, emballage, identification



Cadres



Miroir

Dépose des cadres visuels muraux et miroirs

- Démontage des cadres des murs par dévêissement (lever par le haut)
- Nettoyage
- Conditionnement : protection, emballage, identification
- Dévisage des accroches métalliques du mur

Caisse

Dépose de l'ensemble caisse

- Démontage des tablettes
- Démontage des modules de l'intérieur en dévissant les vis de liaison
- Contrôle de l'état
- Nettoyage des éléments
- Conditionnement : protection, emballage, identification



Mobiliers centraux

Dépose des éléments mobiles

- Contrôle de l'état
- Nettoyage des éléments
- Conditionnement : protection, emballage, identification



Projet Refresh - 3. Mise en œuvre opérationnelle & essaimage

Ce document est la propriété de Damart. Il ne peut être utilisé, reproduit ou diffusé sans son accord préalable et explicite.

DAMART
